


Vážení spoluobčané,

dovolte, abychom Vás informovali o průběhu stavebních prací během výstavby dálnice

## D1, stavba 137 Přerov – Lipník v období květen - červen 2019

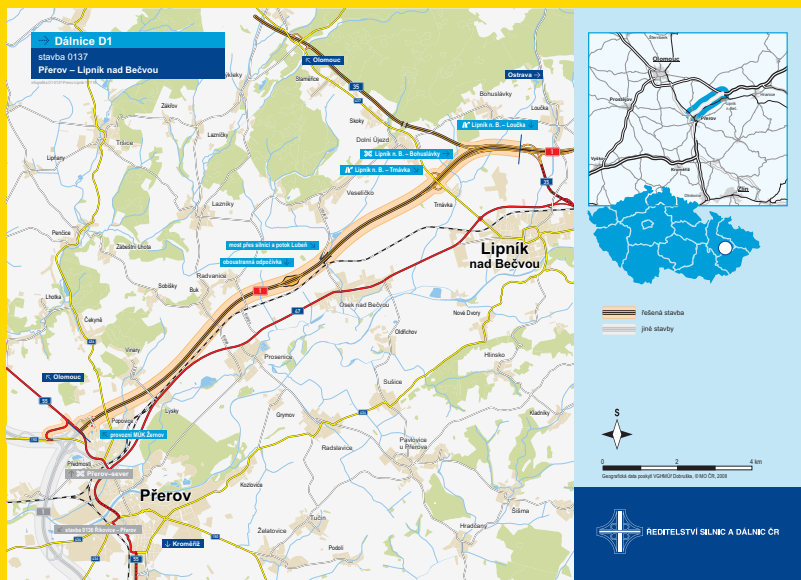

Práce v květnu byly ovlivněny nepříznivým počasím, které se dotklo hlavně zemních prací a prací na podkladních vrstvách vozovek.

Dokončena byla sanační opatření na prvním kilometru trasy v Předmostí včetně středové kanalizace a přípojek k uličním vpustím. Současně byly provedeny zbývající chráničky systému SOS a byly zahájeny pokládky podkladních vozkových vrstev ze štěrkodrtí. Pod mostním objektem Vinary – Lýsky byla dokončena vrstva mechanicky zpevněného kameniva a proveden cementobetonový kryt. Ten byl také proveden v délce 500 m v úseku od mostu na Radvanice směrem k Lipníku. Rovněž byl dokončen úsek betonové vozovky v lokalitě Trnávka na přípojevcích a odbočovacích větvích.

Byla dokončena geodeska pod vlastní vozovkou v prostoru popílkoviště Prosenice, provedeny vrstvy štěrkodrtí a připravuje se pokládka mechanicky zpevněného kameniva. Na pravé odpočívce jsou těsně před dokončením pokládky podkladních vozkových vrstev.

No konci úseku u dálnice D35 pokračují práce na napojení nové trasy komunikace na mostní objekt vedle stávající D35 – jižní kolektorová větev. Byl dokončen odkop zemního tělesa vpravo pro napojení směr Lipník, provedena výměna zeminy v podloží, bylo zahájeno sypání násypu před mostním objektem na jižní kolektorové větvi. Pokračuje se v budování nové trasy kanalizace a nahrazení stávající kanalizace na D35. Současně se zemními pracemi probíhají zásypy opěr mostního objektu na této kolektorové větvi.

Dále pokračují dokončovací práce na mostních objektech. Provádí se římsy, izolace, zábradlí. Na mostním objektu nad dálnicí na Žernov pokračují práce na římsách, na mostní estakádě nad silnicí Osek – Veselíčko proběhla poslední betonáž nosné konstrukce. Na mostním objektu mezi Trnávkou a D35 pokračují práce na nosné konstrukci levého kolektorového mostu – probíhá bednění a armování.

Pokračují práce na protihlukových stěnách, osazují se výplňové panely. Pracuje se na dlažbách mezi vozovkou a protihlukovou stěnou stejně jako na oplocení dálnice, vegetačních úpravách a realizaci svodidel.

V příštím období se budeme soustředit hlavně na pokládky mechanicky zpevněného kameniva, pokládky cementobetonového krytu a pokládky živičných vrstev. U mostních objektů budou hlavní kapacity směřovány k pracím na mostě Přerov – Žernov, na estakádě nad silnicí Osek – Veselíčko, na dokončení nosné konstrukce levého kolektorového mostu mezi Trnávkou a D35 a na dokončení mostů na jižní kolektorové větvi Olomouc - Ostrava.

**Spoluobčané, ubezpečujeme vás, že děláme vše, abychom minimalizovali dopad našich činností na vás, obyvatele z blízkého okolí stavby, a neomezovali jsme váš běžný život.**

Děkujeme za pochopení  
Skanska

V případě dotazů nás kontaktujte na emailové adrese: [d1lipnik@skanska.cz](mailto:d1lipnik@skanska.cz)
