


Vážení spoluobčané,

dovolte, abychom Vás informovali o průběhu stavebních prací během výstavby dálnice

D1, stavba 137 Přerov – Lipník v období červenec 2019

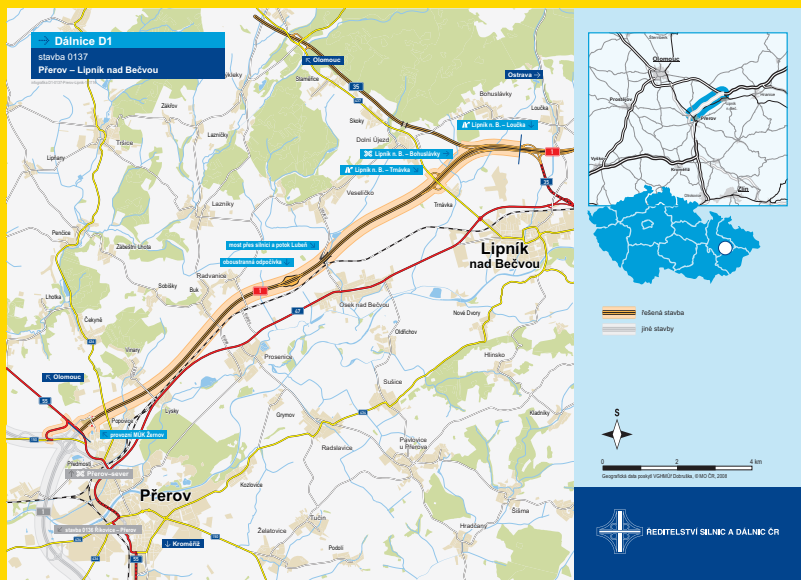

Na začátku trasy v délce lehce přes 2 kilometry byly dokončeny pokládky podkladních vozkových vrstev ze šterkodrti a mechanicky zpevněného kameniva. V tomto úseku je už rovněž dokončena i betonová vozovka. Dokončeny byly i úseky mechanicky zpevněného kameniva na násypch před obcí Buk, v místě původního jezírka a v prostoru popílkoviště Prosenice. V těchto úsecích jsou již položeny i první dvě vrstvy živичného souvrství.

Na konci úseku u dálnice D35 byla dokončena nová trasa kanalizace a postupně se začínají realizovat podkladní vrstvy v místě napojení na stávající dálnici Brno – Ostrava. Vedle provozovaného úseku D35 se pokračuje v realizaci jižního kolektoru, který bude zajišťovat dopravu ve směru Brno – Ostrava, probíhají práce na aktivní zóně, podkladních vrstvách, dokončují se základy u mostních objektů a na vlastních mostech probíhají dokončovací práce.

Pokračují i práce na mostních objektech. Na mostním objektu nad dálnicí Přerov - Žernov zbývá provést vozkové vrstvy v souběhu s navazující komunikací – dokončení prací je naplánováno na konec srpna. Na mostní estakádě nad silnicí Osek – Veselíčko se postupně betonují jednotlivé úseky říms a připravují se izolace mostovky. Na mostním objektu mezi Trnávkou a D35 proběhla betonáž nosné konstrukce levého kolektorového mostu a v současnosti se začíná odstraňovat podpůrná skruž. Na pravém kolektorovém mostě byla položena vrstva živice současně s úsekem v předpolí mostu. Na mostech na hlavní trase postupně probíhají izolace a betonáže říms.

Pokračují práce na protihlukových stěnách, osazují se výplňové panely. Před dokončením jsou úniková schodiště. Pracuje se na finálním odvodnění vozovek, zahájeny byly práce na těsnění spár na betonové vozovce. Postupně se provádí montáže ocelových svodidel a pokládky trubek pro SOS systém.

V měsíci srpnu je v plánu dokončení pokládky cementobetonového krytu na hlavní trase a pokládky živичných vrstev na vysokých násypch. Dále je v plánu dokončení mostního objektu Přerov – Žernov, na estakádě nad silnicí Osek – Veselíčko a na mostě mezi Trnávkou a D35 budou probíhat práce na izolacích a římsách a před dokončením budou dva mosty na jižní kolektorové větvi Brno - Ostrava.

Spoluobčané, ubezpečujeme vás, že děláme vše, abychom minimalizovali dopad našich činností na vás, obyvatele z blízkého okolí stavby, a neomezovali jsme váš běžný život.

Děkujeme za pochopení
Skanska

V případě dotazů nás kontaktujte na emailové adrese: d1lipnik@skanska.cz
