


Vážení spoluobčané,

dovolte, abychom Vás informovali o průběhu stavebních prací během výstavby dálnice

D1, stavba 137 Přerov – Lipník v období srpen - září 2019

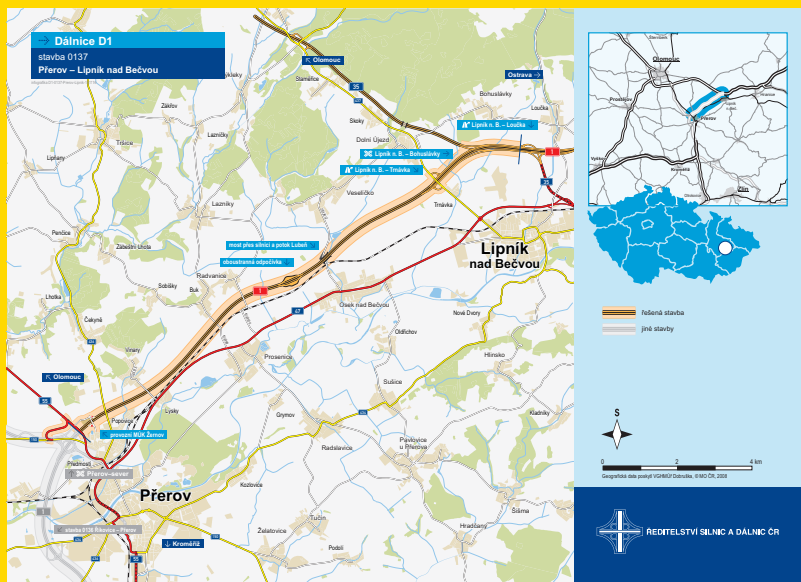

Téměř na celé trase je položena betonová vozovka s výjimkou napojení na provozovaný úsek dálnice D35. Tato část bude provedena v měsíci září. V rámci hlavní trasy se dokončuje napojení na odpočívku, které je rovněž z betonu. Průběžně se provádí finální těsnění spár betonové vozovky pomocí pružných těsnících profilů. Živičné úseky vozovky jsou provedeny kromě napojení na mostní objekt SO 208 – most přes Radvanický potok, SO 209 – mostní estakáda nad komunikací Osek – Veselíčko a SO 215 – most mezi Trnávkou a D35. Tyto úseky jsou v plánu v měsíci září a dokončení v měsíci říjnu. V celém úseku hlavní trasy probíhají práce na dokončení odvodnění – realizace monolitických žlabů vedle vozovky, osazování štěrbinových žlabů a pokládka žlabů prefabrikovaných. Současně s těmito pracemi se průběžně kompletují ocelová svodidla, zahájeno bylo také osazování svodidel betonových.

No konci úseku vedle provozovaného úseku D35 se pokračuje v realizaci jižního kolektoru, který bude zajišťovat dopravu ve směru Brno – Ostrava. Byly dokončeny podkladní vrstvy a probíhají práce na živičné vozovce. Dokončení této sestavy objektů je v plánu do začátku října a po nezbytných prohlídkách a odsouhlasení provedených prací je v plánu puštění do provozu na přelomu října a listopadu.

Usilovně se pracuje i na zbývajících mostních objektech. Byl dokončen mostní objekt nad dálnicí Přerov - Žernov spolu s navazující komunikací a nyní jsou v plánu prohlídky před uvedením do provozu, který plánujeme na konec září. Na mostní estakádě nad silnicí Osek – Veselíčko se zahájili izolace mostovky, byly osazeny dilatační závěry. Na mostním objektu mezi Trnávkou a D35 byl do staveništního provozu puštěn pravý kolektorový most, dále je položena první vrstva živice na pravém mostě a na levém mostě a levém kolektorovém mostě se pokračuje v izolacích a pracích na římsách. Práce jsou koordinovány tak, aby živičné vrstvy na mostech navazovaly na pokládky živičných vrstev v předpolí mostů. Před dokončením jsou mosty na kolektorové větvi vedoucí souběžně s D35.

Na protihlukových stěnách chybí dokončit již pouze krátké úseky, jedná se části na valu a pod vedeními VVN. Osazují se únikové dveře a připravuje se i osazení stěny na mostech. Trubky pro SOS systém jsou před dokončením, zbývá průchod přes dva mostní objekty a propojení s trasou na D35. V září je v plánu zafouknutí optických vláken do první poloviny trasy. V měsíci srpnu proběhlo osazení ocelových konstrukcí portálů včetně dvou konstrukcí na provozovaném úseku dálnice D4704, kde musel být z těchto důvodů na 15 min přerušen provoz. Postupně se také osazují velkoplošné dopravní značky.

V měsíci září budou dále probíhat dokončovací práce, přibudou práce spojené se záhlvkami mezi vozovkou a žlaby, probíhat budou také kamerové zkoušky na kanalizaci a zahájeny budou práce na finálním značení dálnice.

Spoluobčané, ubezpečujeme vás, že děláme vše, abychom minimalizovali dopad našich činností na vás, obyvatele z blízkého okolí stavby, a neomezovali jsme váš běžný život.

Děkujeme za pochopení
Skanska

V případě dotazů nás kontaktujte na emailové adrese: d1lipnik@skanska.cz
